

V Liberci dne 20. prosince 2012

ev. číslo revizní zprávy : ČRo 7/2012

Výtisk č.:

Počet příloh: 1

Počet listů: 24

ZPRÁVA O PRAVIDELNÉ REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE

Revize provedena dle: ČSN 33 2000-6-701:2007

Revizní technik:	Tomáš Zákoucký	Petr Strnad
Adresa firmy:	Dopravní 537	U Sokolovny 49
	Liberec	Jablonec nad Nisou 7
	463 11	468 04
Ev. č. osvědčení:	1157/8/12/R-EZ-E2A	1196/8/12 R-EZ-E2A
Ev. č. oprávnění:	0508/8/12/EZ-M,O,R,Z-E2A	
Datum zahájení:	25. září 2012	
Datum ukončení:	18. prosince 2012	
Datum vypracování:	20. prosince 2012	

Revizní zpráva je vypracována na základě objednávky č.j. : MR66/2012 a v rozsahu uzavřené smlouvy o provedení práce na zařízení.

Adresa objektu: Český rozhlas
Vinohradská 12
120 99 Praha 2

Název objektu: ČRo
Římská 13
120 99 Praha 2

**Objednavatel
revize:** Český rozhlas
Vinohradská 12
120 99 Praha

**Předložené
dokumenty:** Výchozí revizní zpráva
Projektová dokumentace
Protokol o určení vnějších vlivů

Základní údaje: *Jmenovité*
napětí: 3N PE ~ 50Hz 400V / TN-S-C

označení sítí dle
ČSN 33 2000-1 ed.2

Vnější vlivy: *Stanoveny dle*
projektu: AA5,AB5

**Ochrana před
nebezpečným
dotykovým
napětím :** Samočinným odpojením od zdroje

1. Soupis použitých měřicích přístrojů:

Název	Typ	Výrobní číslo
Termokamera	Flir i 3	5862795
Revizní přístroj	C.A.6116	12203 KDV
Revizní přístroj	Metrel Instaltest	17020354

2. Popis: el. Instalace:

Ve 3. podzemním podlaží je umístěna rozvodna objektu.
V objektu jsou vzhledem k důležitosti 3 sítě a to SÍT, DA a UPS.

Popis sítí:

SÍT - Napájena z transformátorů vlastněnými ČRO a napojenými sítí VN společností PRE

DA - V případě normálního provozu napájena stejně jako SÍT ale v případě výpadku sítě napájena z diesel agregátu Caterpillar.

UPS - V případě normálního provozu napájena stejně jako SÍT ale v případě výpadku sítě napájena z UPS po nastartování záložního zdroje napájena jako DA.

Použité kabely:

CYKY, CHTH-V,

Uložení:

kabelové žlaby, kabelové lávky, ve stěnách, lištách,

Přepětí:

Použity svodiče přepětí třídy B v rozvodně, třídy C v podružných rozvaděčích, třídy D v důležitých pracovištích.

Kompensace:

Provedena centrálně v hlavní rozvodně a pak samostatně ve strojovnách vzduchotechniky

3. Měření provedená při revizi:

Měření uzemnění:

Všechny revidované rozvaděče jsou napojeny na centrální uzemnění.
S naměřenou hodnotou - 0,09Ω

Měření přechodového odporu:

Odpor ochranného vodiče a přechodový odpor je 0,09Ω

Ověření ochrany před NDN :

Kontrola samočinného odpojení od zdroje měřením impedance smyčky a vypínací charakteristiky jističů prvků. Naměřené hodnoty jsou max. naměřené.

Měření proudových chráničů:

Měření vypínacího času a vybavovacího proudu.

Měření izolačního odporu:

Měřené hodnoty jsou naměřené minimální. Měření nemohlo být provedeno u sítě UPS a některých obvodů. Vzhledem k tomu, že síť UPS je důležitá pro napájení vysílání a je zde nutný nepřetržitý provoz, nelze měření provést. Kde nemohlo být měření provedeno, je uvedeno v revizi. Měření izolačních odporů provést při nejbližší odstávce zařízení.

Měření termokamerou:

Provedeno měření za pomoci termokamery. Oteplení prvku, spojů, vodičů a zatížení fázových vodičů.

Podrobnosti o zemniči odběratele: odpor uzemnění 0,9Ω

Ochrana před dotykem živých částí (základní ochrana):

	Položka	Shoda s požadavky	Poznámka
1.	Izolace živých částí	ANO	
2.	Přepážky	ANO	
3.	Kryty	ANO	

Zařízení:

	Zařízení	Správnost volby	Správnost Montáž	Poznámka
1.	Kabely	ANO	ANO	
2.	Instalační materiál	ANO	ANO	
3.	Instalační trubky	ANO	ANO	
4.	Úložné kabelové kanály	ANO	ANO	
5.	Rozvodná zařízení	ANO	ANO	
6.	Svídla	ANO	ANO	
7.	Ochranné přístroje (chrániče, jističe atd.)	ANO	ANO	

Označování:

	Položka	Zda umístění	Správnost umístění	Správná formulace	Poznámky
1.	Označení ochranných přístrojů, spínačů a svorek	ANO	ANO	ANO	
2.	Varovné nápisy	ANO	ANO	ANO	
3.	Výstražné nápisy	ANO	ANO	ANO	
4.	Značení vodičů	ANO	ANO	ANO	
5.	Přístroje pro odpojení	ANO	ANO	ANO	
6.	Spínací přístroje	ANO	ANO	ANO	
7.	Schémata a přehledy	ANO	ANO	ANO	

Měření :

RS-1a										
Jištění typ	Označení			Vodič	Zi Ω	Ri MΩ	mA	mS	V	Poznámky
SÍT										
10/1/B	FA	1	s. kancel.	CYKY3C1,5	0,98	2000				
10/1/B	FA	2	s.knací.	CYKY3C1,5	0,96	2000				
10/1/B	FA	3	s. závětrí	CYKY3C1,5	0,87	2000				
10/1/B	FA	4	s. chodba	CYKY3C1,5	0,86	2000				
10/1/B	FA	5	Rez	CYKY3C1,5						
10/1/B	FA	6	s. podatelna	CYKY3C1,5	0,98	2000				
10/1/B	FA	7	schodiště	CYKY3C1,5	0,93	2000				
10/1/B	FA	8	s. nouzové	CYKY3C1,5	0,74	2000				
10/1/B	FA	9	s. čekárna	CYKY3C1,5	0,85	2000				
10/1/B	FA	10	z. běžné	CYKY3C2,5	0,82	2000				
10/1/B	FA	11	z. pc	CYKY3C2,5	0,83	2000				
10/1/B	FA	12	z. běžné	CYKY3C2,5	0,84	2000				
10/1/B	FA	13	z. pc	CYKY3C2,5	0,83	2000				
10/1/B	FA	14	z. běžné	CYKY3C2,5	0,83	2000				
10/1/B	FA	15	z. pc	CYKY3C2,5	0,87	2000				
10/1/B	FA	16	z. běžné	CYKY3C2,5	0,90	2000				
10/1/B	FA	17	z. pc	CYKY3C2,5	0,69	2000				
10/1/B	FA	18	z. běžné	CYKY3C2,5	0,98	2000				
10/1/B	FA	19	z. běžné	CYKY3C2,5	0,96	2000				
10/1/B	FA	20	z. pc	CYKY3C2,5	0,87	2000				
10/1/B	FA	21	neznámé	CYKY3C2,5	0,86	2000				
10/1/B	FA		z.kancel.	CYKY3C2,5	0,91	2000				
16/1/B	FA	30	z.chodba	CYKY3C2,5	0,98	2000				
16/1/B	FA	31	Rez.							
16/1/B	FA	32	Rez.							
16/1/B	FA	33	z.čekárna	CYKY3C2,5	0,85	2000				
16/1/B	FA	34	Rez.	CYKY3C2,5	0,82	2000				
16/1/B	FA	35	Vzt	CYKY3C2,5	0,83	2000				
16/1/B	FA	36	Fancoil	CYKY3C1,5	0,84	2000				
16/1/B	FA	37	Hodiny	CYKY3C2,5	0,83	2000				
6/1/B	FA	38	Hodiny	CYKY3C1,5	0,83	2000				
16/1/B	FA	39	Rezerva	CYKY3C2,5	0,87	2000				
6/1/B	FA	40	čidlo	CYKY3C1,5	0,90	2000				
16/1/B	FA	41	Kamery	CYKY3C2,5	0,69	2000				
16/1/B		Z. BADATELNA		CYKY3C1,5	0,98	2000				
DA										
10/1/B	FA	1	s. chodba	CYKY3C1,5	0,83	2000				
10/1/B	FA	2	s. schodiště	CYKY3C1,5	0,84	2000				
10/1/B	FA	3	s. čekárna	CYKY3C1,5	0,83	2000				
10/1/B	FA	4	s. závětrí	CYKY3C1,5	0,83	2000				
10/1/B	FA	5	Roleta mříže	CYKY3C1,5	0,87	2000				
10/1/B	FA	6	Pos. dveře	CYKY3C1,5	0,90	2000				
10/1/B	FA	7	Pos. dveře	CYKY3C1,5	0,69	2000				
16/1/B	FA		badatelna	CYKY3C2,5	0,98	2000				
UPS										
10/1/B	FA	1	časovač		0,62	Nelze odpojit				
16/1/B	FA2	2	VT-a1	CYKY3C2,5	0,63	Nelze odpojit				
16/1/B	FA		neoznačen	CYKY3C2,5						
RS-2a										
Jištění typ	Označení			Vodič	Zi Ω	Ri MΩ	mA	mS	V	Poznámky
SÍT										
10/1/B	FA	1	s. kancel.	CYKY3C1,5	0,98	2000				
10/1/B	FA	2	s.knací.	CYKY3C1,5	0,96	2000				
10/1/B	FA	3	s.kancel.	CYKY3C1,5	0,87	2000				
10/1/B	FA	4	s. chodba	CYKY3C1,5	0,86	2000				
10/1/B	FA	5	s. sociálky	CYKY3C1,5						
10/1/B	FA	6	s. fonotéka	CYKY3C1,5	0,98	2000				
10/1/B	FA	7	schodiště	CYKY3C1,5	0,93	2000				
10/1/B	FA	10	z. běžné	CYKY3C2,5	0,82	2000				
10/1/B	FA	11	z. pc	CYKY3C2,5	0,83	2000				
10/1/B	FA	12	z. běžné	CYKY3C2,5	0,84	2000				

10/1/B	FA 13	z. pc	CYKY3C2,5	0,83	2000				
10/1/B	FA 14	z. běžné	CYKY3C2,5	0,83	2000				
10/1/B	FA 15	z. pc	CYKY3C2,5	0,87	2000				
10/1/B	FA 16	z. běžné	CYKY3C2,5	0,90	2000				
10/1/B	FA 17	z. pc	CYKY3C2,5	0,69	2000				
10/1/B	FA 18	z. běžné	CYKY3C2,5	0,98	2000				
10/1/B	FA 19	z. běžné	CYKY3C2,5	0,96	2000				
10/1/B	FA 20	rezerva	CYKY3C2,5						
10/1/B	FA 21	neznámé	CYKY3C2,5	0,86	2000				
10/1/B	FA 22	z.kancel.	CYKY3C2,5	0,91	2000				
10/1/B	FA 23	rezerva	CYKY3C2,5						
10/1/B	FA 24	z. pc	CYKY3C2,5	0,83	2000				
10/1/B	FA 25	z. běžné	CYKY3C2,5	0,84	2000				
16/1/B	FA 30	z. úklid	CYKY3C2,5	0,98	2000				
16/1/B	FA 31	z. úklid	CYKY3C2,5	0,93	2000				
16/1/B	FA 32	Lednice	CYKY3C2,5	0,74	2000				
16/1/B	FA 33	Kávovar	CYKY3C2,5	0,85	2000				
16/1/B	FA 34	MV trouba	CYKY3C2,5	0,82	2000				
16/1/B	FA 35	Vafič	CYKY3C2,5	0,83	2000				
16/1/B	FA 36	Rezerva	CYKY3C1,5						
16/1/B	FA 37	Fancoily	CYKY3C2,5	0,83	2000				
6/1/B	FA 38	Čas	CYKY3C1,5	0,83	2000				
16/1/B	FA 39	z. archiv	CYKY3C2,5	0,87	2000				
6/1/B	FA 40	z. archiv	CYKY3C1,5	0,90	2000				
16/1/B	FA 41	z. gram archiv	CYKY3C2,5	0,69	2000				

DA

10/1/B	FA 1	s. chodba	CYKY3C1,5	0,83	2000				
10/1/B	FA 2	s. schodiště	CYKY3C1,5	0,84	2000				
16/1/B	FA	kopírka	CYKY3C2,5	0,98	2000				

UPS

10/1/B	FA 1	časovač		0,62	Nelze odpojit				
16/1/B	FA 2	EPS	CYKY3C2,5	0,63	Nelze odpojit				
10/1/B	FA 3	EZS	CYKY3C1,5	0,87	2000				
10/1/B	FA 4	STA	CYKY3C1,5	0,86	2000				
10/1/B	FA 5	MAR	CYKY3C1,5						
16/1/B	FA 6	Z. M.Č. 109	CYKY3C2,5	0,98	2000				
10/1/B	FA 7	REZ	CYKY3C1,5						
10/1/B	FA 10	REZ	CYKY3C1,5						

RS-3a

Jištění typ	Označení	Vodič	Zi Ω	Ri $M\Omega$	mA	mS	V	Poznámky
-------------	----------	-------	-------------	--------------	----	----	---	----------

SÍT

10/1/B	FA 1	s. kancel.	CYKY3C1,5	0,98	2000				
10/1/B	FA 2	s.knancel.	CYKY3C1,5	0,96	2000				
10/1/B	FA 3	s.kancel.	CYKY3C1,5	0,87	2000				
10/1/B	FA 4	s. chodba	CYKY3C1,5	0,86	2000				
10/1/B	FA 5	s. sociálky	CYKY3C1,5						
10/1/B	FA 6	s. fonotéka	CYKY3C1,5	0,98	2000				
10/1/B	FA 7	schodiště	CYKY3C1,5	0,93	2000				
10/1/B	FA 10	z. běžné	CYKY3C2,5	0,82	2000				
10/1/B	FA 11	Vitrina atriu.	CYKY3C2,5	0,83	2000				
10/1/B	FA 12	z. běžné	CYKY3C2,5	0,84	2000				
10/1/B	FA 13	z. pc	CYKY3C2,5	0,83	2000				
10/1/B	FA 14	z. běžné	CYKY3C2,5	0,83	2000				
10/1/B	FA 15	z. pc	CYKY3C2,5	0,87	2000				
10/1/B	FA 16	z. běžné	CYKY3C2,5	0,90	2000				
10/1/B	FA 17	z. pc	CYKY3C2,5	0,69	2000				
10/1/B	FA 18	z. běžné	CYKY3C2,5	0,98	2000				
10/1/B	FA 19	z. běžné	CYKY3C2,5	0,96	2000				
10/1/B	FA 20	rezerva	CYKY3C2,5						
10/1/B	FA 21	neznámé	CYKY3C2,5	0,86	2000				
10/1/B	FA 22	z.kancel.	CYKY3C2,5	0,91	2000				
10/1/B	FA 23	rezerva	CYKY3C2,5						
10/1/B	FA 24	z. pc	CYKY3C2,5	0,83	2000				
10/1/B	FA 25	z. běžné	CYKY3C2,5	0,84	2000				
16/1/B	FA 30	z. úklid	CYKY3C2,5	0,98	2000				
16/1/B	FA 31	z. úklid	CYKY3C2,5	0,93	2000				
16/1/B	FA 32	Lednice	CYKY3C2,5	0,74	2000				
16/1/B	FA 33	Kávovar	CYKY3C2,5	0,85	2000				
16/1/B	FA 34	MV trouba	CYKY3C2,5	0,82	2000				
16/1/B	FA 35	Vafič	CYKY3C2,5	0,83	2000				
16/1/B	FA 36	Rezerva	CYKY3C1,5						
16/1/B	FA 37	Fancoily	CYKY3C2,5	0,83	2000				
6/1/B	FA 38	Čas	CYKY3C1,5	0,83	2000				
16/1/B	FA 39	z. archiv	CYKY3C2,5	0,87	2000				

6/1/B	FA	40	z. archiv	CYKY3C1,5	0,90	2000				
16/1/B	FA	41	z. gram archiv	CYKY3C2,5	0,69	2000				
DA										
10/1/B	FA	1	s. chodba	CYKY3C1,5	0,83	2000				
10/1/B	FA	2	s. schodiště	CYKY3C1,5	0,84	2000				
16/1/B	FA		kopírka	CYKY3C2,5	0,98	2000				
UPS										
10/1/B	FA	1	časovač		0,62	Nelze odpojit				
16/1/B	FA2	2	VT-a1	CYKY3C2,5	0,63	Nelze odpojit				
6/1/B	FA		Čas spínač	CYKY3C2,5	0,63	Nelze odpojit				
RS-2a										
Jištění typ	Označení			Vodič	Zi Ω	Ri MΩ	mA	mS	V	Poznámky
SÍT										
10/1/B	FA	1	s. kancel.	CYKY3C1,5	0,98	2000				
10/1/B	FA	2	s.knancel.	CYKY3C1,5	0,96	2000				
10/1/B	FA	3	s.kancel.	CYKY3C1,5	0,87	2000				
10/1/B	FA	4	s. chodba	CYKY3C1,5	0,86	2000				
10/1/B	FA	5	s. sociálky	CYKY3C1,5						
10/1/B	FA	6	s. fonotéka	CYKY3C1,5	0,98	2000				
10/1/B	FA	7	schodiště	CYKY3C1,5	0,93	2000				
10/1/B	FA	10	z. běžné	CYKY3C2,5	0,82	2000				
10/1/B	FA	11	z. pc	CYKY3C2,5	0,83	2000				
10/1/B	FA	12	z. běžné	CYKY3C2,5	0,84	2000				
10/1/B	FA	13	z. pc	CYKY3C2,5	0,83	2000				
10/1/B	FA	14	z. běžné	CYKY3C2,5	0,83	2000				
10/1/B	FA	15	z. pc	CYKY3C2,5	0,87	2000				
10/1/B	FA	16	z. běžné	CYKY3C2,5	0,90	2000				
10/1/B	FA	17	z. pc	CYKY3C2,5	0,69	2000				
10/1/B	FA	18	z. běžné	CYKY3C2,5	0,98	2000				
10/1/B	FA	19	z. běžné	CYKY3C2,5	0,,96	2000				
10/1/B	FA	20	rezerva	CYKY3C2,5						
10/1/B	FA	21	neznámé	CYKY3C2,5	0,86	2000				
10/1/B	FA	22	z.kancel.	CYKY3C2,5	0,91	2000				
10/1/B	FA	23	rezerva	CYKY3C2,5						
10/1/B	FA	24	z. pc	CYKY3C2,5	0,83	2000				
10/1/B	FA	25	z. běžné	CYKY3C2,5	0,84	2000				
16/1/B	FA	30	z. úklid	CYKY3C2,5	0,98	2000				
16/1/B	FA	31	z. úklid	CYKY3C2,5	0,93	2000				
16/1/B	FA	32	Lednice	CYKY3C2,5	0,74	2000				
16/1/B	FA	33	Kávovar	CYKY3C2,5	0,85	2000				
16/1/B	FA	34	MV trouba	CYKY3C2,5	0,82	2000				
16/1/B	FA	35	Vařič	CYKY3C2,5	0,83	2000				
16/1/B	FA	36	Rezerva	CYKY3C1,5						
16/1/B	FA	37	Fancoily	CYKY3C2,5	0,83	2000				
6/1/B	FA	38	Čas	CYKY3C1,5	0,83	2000				
16/1/B	FA	39	z. archiv	CYKY3C2,5	0,87	2000				
6/1/B	FA	40	z. archiv	CYKY3C1,5	0,90	2000				
16/1/B	FA	41	z. gram archiv	CYKY3C2,5	0,69	2000				
DA										
10/1/B	FA	1	s. chodba	CYKY3C1,5	0,83	2000				
10/1/B	FA	2	s. schodiště	CYKY3C1,5	0,84	2000				
16/1/B	FA		kopírka	CYKY3C2,5	0,98	2000				
UPS										
10/1/B	FA	1	časovač		0,62	Nelze odpojit				
16/1/B	FA	2	EPS	CYKY3C2,5	0,63	Nelze odpojit				
10/1/B	FA	3	EZS	CYKY3C1,5	0,87	2000				
10/1/B	FA	4	STA	CYKY3C1,5	0,86	2000				
10/1/B	FA	5	MAR	CYKY3C1,5						
16/1/B	FA	6	Z . M.Č. 109	CYKY3C2,5	0,98	2000				
RS-4a										
Jištění typ	Označení			Vodič	Zi Ω	Ri MΩ	mA	mS	V	Poznámky
SÍT										
10/1/B	FA	1	s. kancel.	CYKY3C1,5	0,98	2000				
10/1/B	FA	2	s.knancel.	CYKY3C1,5	0,96	2000				

10/1/B	FA	3	s.kancel.	CYKY3C1,5	0,87	2000				
10/1/B	FA	4	s. chodba	CYKY3C1,5	0,86	2000				
10/1/B	FA	5	s. sociálky	CYKY3C1,5	0,83	2000				
10/1/B	FA	6	s. fonotéka	CYKY3C1,5	0,98	2000				
10/1/B	FA	7	schodiště	CYKY3C1,5	0,93	2000				
10/1/B	FA	10	z. běžné	CYKY3C2,5	0,82	2000				
10/1/B	FA	11	Vitrina atriu,	CYKY3C2,5	0,83	2000				
10/1/B	FA	12	z. běžné	CYKY3C2,5	0,84	2000				
10/1/B	FA	13	z. pc	CYKY3C2,5	0,83	2000				
10/1/B	FA	14	z. běžné	CYKY3C2,5	0,83	2000				
10/1/B	FA	15	z. pc	CYKY3C2,5	0,87	2000				
10/1/B	FA	16	z. běžné	CYKY3C2,5	0,90	2000				
10/1/B	FA	17	z. pc	CYKY3C2,5	0,69	2000				
10/1/B	FA	18	z. běžné	CYKY3C2,5	0,98	2000				
10/1/B	FA	19	z. běžné	CYKY3C2,5	0,96	2000				
10/1/B	FA	20	rezerva	CYKY3C2,5	0,87	2000				
10/1/B	FA	21	neznámé	CYKY3C2,5	0,86	2000				
10/1/B	FA	22	z.kancel.	CYKY3C2,5	0,91	2000				
10/1/B	FA	23	rezerva	CYKY3C2,5	0,82	2000				
10/1/B	FA	24	z. pc	CYKY3C2,5	0,83	2000				
10/1/B	FA	25	z. běžné	CYKY3C2,5	0,84	2000				
16/1/B	FA	30	z. úklid	CYKY3C2,5	0,98	2000				
16/1/B	FA	31	z. úklid	CYKY3C2,5	0,93	2000				
16/1/B	FA	32	Lednice	CYKY3C2,5	0,74	2000				
16/1/B	FA	33	Kávovar	CYKY3C2,5	0,85	2000				
16/1/B	FA	34	MV trouba	CYKY3C2,5	0,82	2000				
16/1/B	FA	35	Vaříč	CYKY3C2,5	0,83	2000				
16/1/B	FA	36	Rezerva	CYKY3C1,5						
16/1/B	FA	37	Fancoily	CYKY3C2,5	0,83	2000				
6/1/B	FA	38	Čas	CYKY3C1,5	0,83	2000				

DA

10/1/B	FA	1	s. chodba	CYKY3C1,5	0,83	2000				
10/1/B	FA	2	s. schodiště	CYKY3C1,5	0,84	2000				
16/1/B	FA		kopírka	CYKY3C2,5	0,98	2000				

UPS

10/1/B	FA	1	časovač		0,62	Nelze odpojit				
16/1/B	FA	2	VT-a1	CYKY3C2,5	0,63	Nelze odpojit				

RS-6a

SEKCE SÍŤ

B10	FA	1	os. kanceláře	CYKY3C1,5	0,68	2000				
B10	FA	2	os. kanceláře	CYKY3C1,5	0,68	2000				
B10	FA	3	os. kanceláře	CYKY3C1,5	0,68	2000				
B10	FA	4	os. chodba	CYKY3C1,5	0,68	2000				
B10	FA	5	os. wc	CYKY3C1,5	0,68	2000				
B10	FA	6	os.schodiště	CYKY3C1,5	0,68	2000				
B10	FA	7	os. hala	CYKY3C1,5	0,68	2000				
B10	FA	8	os.schodiště	CYKY3C1,5	0,68	2000				
B10	FA	9	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	2000				
B10	FA	10	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	2000				
B10	FA	11	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	2000				
B10	FA	12	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	2000				
B10	FA	13	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	2000				
B10	FA	14	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	2000				
10/0,03	FI	0	os. venkovní	CYKY3C1,5	0,68	2000	25	11	0	
B10	FA	15	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	2000				
B10	FA	16	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	2000				
B10	FA	17	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	2000				
B10	FA	18	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	2000				
B10	FA	19	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	2000				
B10	FA	20	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	2000				
B10	FA	21	rezerva	CYKY3C2,5	1,06	2000				
B10	FA	22	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	2000				
B10	FA	23	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	2000				
B10	FA	24	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	2000				
B10	FA	25	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	2000				
B16	FA	30	za. uklid	CYKY3C2,5	1,06	2000				
B16	FA	31	za. chodba	CYKY3C2,5	1,06	2000				
B16	FA	32	za. lednice	CYKY3C2,5	1,06	2000				
B16	FA	33	za. kávovar	CYKY3C2,5	1,06	2000				
B16	FA	34	za. mikrovlnka	CYKY3C2,5	1,06	2000				

B16	FA	35	za. varič	CYKY3C2,5	1,06	2000				
B6	FA	36	pisoar	CYKY3C2,5	1,06	2000				
B10	FA	37	fanco	CYKY3C1,5	1,06	2000				
B10	FA	38	vyhřívání guly	CYKY3C2,5	1,06	2000				
10/0,03	FI	40	svítidla ve stropě a na střeše	CYKY3C1,5	1,06	2000	22	18	0	
B16	FA	41	zas. strojovna	CYKY3C2,5	1,06	2000				
B6	FA	42	hodiny	CYKY3C1,5	1,06	2000				
SEKCE DA										
B25	FA	0	r. mar	CYKY3C1,5	1,1	2000				
B10	FA	1	sv. chodba	CYKY3C1,5	1,06	2000				
B10	FA	2	s. schodiště.	CYKY3C2,5	0,68	2000				
B10-16	FA	10	Pož. ventilátor	1-CHTH-V5C6	1,08	2000				
B10-16	FA	11	Pož. ventilátor	1-CHTH-V5C6	0,93	2000				
B10-16	FA	12	Pož. ventilátor	1-CHTH-V5C6	1,01	2000				
B10-16	FA	13	Pož. ventilátor	1-CHTH-V5C6	0,83	2000				
B10-16	FA	14	Pož. ventilátor	1-CHTH-V5C6	0,71	2000				
B10-16	FA	15	Pož. ventilátor	1-CHTH-V5C6	0,69	2000				
B10-16	FA	16	Pož. ventilátor	1-CHTH-V5C6	0,68	2000				
B10-16	FA	16	Pož. ventilátor	1-CHTH-V5C6	0,67	2000				
B16			kopírka	CYKY3C2,5	0,68	2000				
SEKCE UPS										
10/1/B	FA	1	časovač		0,62	Nelze odpojit				
16/1/B	FA	2	EPS	CYKY3C2,5	0,63	Nelze odpojit				
10/1/B	FA	3	EZS	CYKY3C1,5	0,87	Nelze odpojit				
10/1/B	FA	4	STA	CYKY3C1,5	0,86	Nelze odpojit				
10/1/B	FA	5	MAR	CYKY3C1,5		Nelze odpojit				
10/1/B	FA	6	MAR	CYKY3C1,5	0,98	Nelze odpojit				
10/1/B	FA		POŽAR KLAPKA	CYKY3C1,5	0,68	Nelze odpojit				
16/1/B	FA		Z. KANCELŘ	CYKY3C2,5	0,68	2000				
RS-03b										
SÍT										
10/1/B	FA	1	Rezerva	CYKY3C1,5						
10/1/B	FA	2	s. strojovna	CYKY3C1,5	0,87	2000				
10/1/B	FA	3	s. sklad	CYKY3C1,5	0,90	2000				
10/1/B	FA	4	Nouz. Osvět.	CYKY3C1,5	0,69	2000				
10/1/B	FA	5	s. sklady	CYKY3C1,5	0,98	2000				
10/1/B	FA	6	s. schodiště	CYKY3C1,5	0,96	2000				
10/1/B	FA	7	s. vit. Šachty	CYKY3C1,5	0,87	2000				
10/1/B	FA	8	s. vit. Stroj.	CYKY3C1,5	0,86	2000				
10/1/B	FA	9	Světlo . vit	CYKY3C1,5	0,91	2000				
16/1/B	FA	10	z. desinfekce	CYKY3C2,5	0,82	2000				
16/1/B	FA	11	z. sklad	CYKY3C2,5	0,83	2000				
16/1/B	FA	12	z. sklad	CYKY3C2,5	0,84	2000				
16/1/B	FA	13	z. archiv	CYKY3C2,5	0,98	2000				
16/1/B	FA	14	z. výtah stroj.	CYKY3C2,5	0,93	2000				
16/1/B	FA	15	z. šachta vit	CYKY3C2,5	0,74	2000				
16/1/B	FA	16	z. výtah stroj.	CYKY3C2,5	0,85	2000				
16/1/B	FA	17	z. šachta vit	CYKY3C2,5	0,82	2000				
16/1/B	FA	18	Rezerva	CYKY3C2,5						
16/1/B	FA	19	Rezerva	CYKY3C2,5						
16/1/B	FA	20	Rezerva	CYKY3C2,5	0,84	2000				
16/1/B	FA	21	z. servisní	CYKY3C2,5	0,83	2000				
10/1/B	FA	30	s. archiv	CYKY3C1,5	0,62	2000				
10/1/B	FA	31	s. archiv	CYKY3C1,5	0,98	2000				
10/1/B	FA	32	s. archiv	CYKY3C1,5	0,96	2000				
10/1/B	FA	33	s. archiv	CYKY3C1,5	0,87	2000				
10/1/B	FA	34	s. archiv	CYKY3C1,5	0,86	2000				
10/1/B	FA	35	s. archiv	CYKY3C1,5	0,90	2000				
DA										

10/1/B	FA 1	s. chodba	CYKY3C1,5	0,83	2000				
10/1/B	FA 2	s. schodiště	CYKY3C1,5	0,62	2000				
10/1/B	FA 3	s. schodiště	CYKY3C1,5	0,98	2000				
16/1/B	FA 4	Čerpadlo kanaliz.	CYKY3C2,5	0,,96	2000				
16/1/B	FA 5	Kal čerpadlo	CYKY3C2,5	0,87	2000				
10/1/B	FA	s. strojovna	CYKY3C1,5	0,83	2000				

UPS

	FA 1	Časovač		0,82	2000				
10/1/B	FA 2	MaR napájení	CYKY3C1,5	0,83	Nelze odpojit				
10/1/B	FA	MaR-3	CYKY3C1,5	0,84	Nelze odpojit				
6/1/B	FA	Vstup systém	CYKY3C1,5	0,98	Nelze odpojit				

RS-02B

SÍT

10/1/B		sv.gareže fa1	CYKY 3CX1,5	0,90	2000				
10/1/B		sv.gareže fa2	CYKY 3CX1,5	0,69	2000				
10/1/B		rezerva fa3	CYKY 3CX1,5						
10/1/B		sv.gareže fa4	CYKY 3CX1,5	0,91	2000				
10/1/B		rezerva fa5	CYKY 3CX1,5	0,87	2000				
10/1/B		sv. sklad fa6	CYKY 3CX1,5	0,86	2000				
10/1/B		rezerva fa7	CYKY 3CX1,5						
10/1/B		sv.venkovní fa8	CYKY 3CX1,5	0,90	2000				
10/1/B		rezerva fa9	CYKY 3CX1,5						
16/1/B		z.sklad fa10	CYKY 3CX2,5	0,98	2000				
16/1/B		z.garáže fa11	CYKY 3CX2,5	0,96	2000				
16/1/B		z.garáže fa12	CYKY 3CX2,5	0,87	2000				
16/1/B		z.garáže fa13	CYKY 3CX2,5	0,86	2000				
16/1/B		z. Garáže fa14	CYKY 3CX2,5	0,91	2000				
16/1/B		rezerva fa15	CYKY 3CX2,5	0,90	2000				
16/1/B		rezerva fa16	CYKY 3CX2,5	0,69	2000				
6/1/B		paging fa17	CYKY 3CX1,5	0,98	2000				
16/1/B		z.sklad fa20	CYKY 3CX2,5	0,96	2000				
16/3/B		z.sklad fa 21	CYKY 5CX2,5	0,56	2000				

DA

10/1/B		s. garáže fa1	CYKY 3CX1,5	0,93	2000				
10/1/B		rezerva fa2	CYKY 3CX1,5						
10/1/B		rezerva fa3	CYKY 3CX1,5						
10/1/B		s. chodba fa4	CYKY 3CX1,5	0,96	2000				
10/1/B		otv vrat fa5	CYKY 3CX1,5	0,87	2000				
10/1/B		otv vrat fa6	CYKY 3CX1,5	0,86	2000				
MP 16/3		pož. Vent. Fa 10	CYKY 5CX2,5	0,78	2000				
10/1/B		požar. Vent. fa11	CYKY 3CX1,5	0,90	2000				

RS-01b

SÍT

10/1/B	FA 1	s.garáže	CYKY3C1,5						
10/1/B	FA 2	s. garáže	CYKY3C1,5	0,87	2000				
10/1/B	FA 3	S rezerva	CYKY3C1,5	0,90	2000				
10/1/B	FA 4	s. odpady	CYKY3C1,5	0,69	2000				
10/1/B	FA 5	s. schodiště	CYKY3C1,5	0,98	2000				
10/1/B	FA 6	s. sklady	CYKY3C1,5	0,96	2000				
10/1/B	FA 7	s. schodiště	CYKY3C1,5	0,87	2000				
10/1/B	FA 8	Rezerva	CYKY3C1,5	0,86	2000				
10/1/B	FA 9	Rezerva	CYKY3C1,5	0,91	2000				
16/1/B	FA 10	z. sklad	CYKY3C2,5	0,82	2000				
16/1/B	FA 11	z. garáže	CYKY3C2,5	0,83	2000				
16/1/B	FA 12	z. garáže	CYKY3C2,5	0,84	2000				
16/1/B	FA 13	z. garáže	CYKY3C2,5	0,98	2000				

16/1/B	FA	14	z. garáže	CYKY3C2,5	0,93	2000				
16/1/B	FA	15	z. garáže	CYKY3C2,5	0,74	2000				
16/3/B	FA	16	Z. odpad	CYKY5C2,5	0,85	2000				
16/3/B	FA	17	z. garáže	CYKY5C2,5	0,82	2000				
16/1/B	FA	18	z. odpady	CYKY3C2,5	0,84	2000				
16/1/B	FA	19	z. garáže	CYKY3C2,5	0,98	2000				
16/1/B	FA	20	z. servisní	CYKY3C2,5	0,84	2000				
16/3/B	FA	21	z. servisní	CYKY5C2,5	0,83	2000				

DA

10/1/B	FA	1	s. garáže	CYKY3C1,5	0,83	2000				
10/1/B	FA	2	s. schodiště	CYKY3C1,5	0,62	2000				
10/1/B	FA	3	s. schodiště	CYKY3C1,5	0,98	2000				
10/1/B	FA	4	ovládání.	CYKY3C2,5	0,96	2000				
10/1/B	FA	5	ovládání	CYKY3C2,5	0,87	2000				

RS-9b

SÍT

Typ	Označení v rozvaděči	Funkce	kabel typ průřez	Impedance smyčky (Zs)	Izolační odpor (MΩ)	Ri MΩ	Idn mA	Td ms	Ud V	
B10	FA	1	os. kanceláře	CYKY3C1,5	0,68	2000				
B10	FA	2	os. kanceláře	CYKY3C1,5	0,68	2000				
B10	FA	3	os. kanceláře	CYKY3C1,5	0,68	2000				
B10	FA	4	os. chodba	CYKY3C1,5	0,68	2000				
B10	FA	5	os. schodiště	CYKY3C1,5	0,68	2000				
B10	FA	6	os. wc	CYKY3C1,5	0,68	2000				
B10	FA	7	rez.	CYKY3C1,5	0,68	2000				
B10	FA	8	os. kanceláře	CYKY3C1,5	0,68	2000				
B10	FA	9	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	2000				
B10	FA	10	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	2000				
B10	FA	11	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	2000				
B10	FA	12	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	2000				
B10	FA	13	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	2000				
B10	FA	14	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	2000				
10/0,03	FK	0	os. venkovní	CYKY3C1,5	0,68	2000	25	11	0	
B10	FA	15	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	2000				
B10	FA	16	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	2000				
B10	FA	17	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	2000				
B10	FA	18	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	2000				
B10	FA	19	rez.	CYKY3C2,5	1,06	2000				
B10	FA	20	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	2000				
B10	FA	21	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	2000				
B10	FA	22	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	2000				
B10	FA	23	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	2000				
B10	FA	24	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	2000				
B10	FA	24	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	2000				
B16	FA	30	za. úklid	CYKY3C2,5	1,06	2000				
B16	FA	31	za. ukli	CYKY3C2,5	1,06	2000				
B16	FA	32	za. lednice	CYKY3C2,5	1,06	2000				
B16	FA	33	za. kávovar	CYKY3C2,5	1,06	2000				
B16	FA	34	za. mikrovlňka	CYKY3C2,5	1,06	2000				
B16	FA	35	za. vařič	CYKY3C2,5	1,06	2000				
B6	FA	36	pisoár	CYKY3C2,5	1,06	2000				
B10	FA	37	fanco	CYKY3C1,5	1,06	2000				
B10	FA	38	fanco	CYKY3C1,5	1,06	2000				
B10	FA	39	za. chodba	CYKY3C2,5	1,06	2000				
B10	FA	40	žaluzie	CYKY3C2,5	1,06	2000				
B6	FA	41	hodiny	CYKY3C1,5	1,06	2000				
B10	FA	42	vyhřívání guly	CYKY3C2,5	1,06	2000				
10/0,03	FA	43	ohř. parabol	CYKY3C2,5	1,06	2000	26	18	0,4	
10/0,03	FA	45	ohř. parabol	CYKY3C2,5	1,06	2000	18	10	0,4	
B10	FA	46	cv stoupačka	CYKY3C2,5	1,06	2000				
B10	FA	47	zas. stoupačka	CYKY3C2,5	1,06	2000				
B10	FA	48	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	2000				
B10	FA	49	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	2000				
B10	FA	50	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	2000				
B10	FA	51	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	2000				

B10	FA	52	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	2000				
B10	FA	53	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	2000				
B10	FA	54	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	2000				
B10	FA	55	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	2000				
B10	FA	56	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	2000				
B10	FA	57	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	2000				
B10	FA	58	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	2000				
B10	FA	59	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	2000				
B10	FA	60	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	2000				
B10	FA	61	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	2000				
B10	FA	62	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	2000				
B10	FA	63	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	2000				
B10	FA	64	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	2000				
B10	FA	65	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	2000				
B10			vyhřívání guly	CYKY3C1,5	0,65	2000				

SEKCE DA

B10	FA	1	sv. chodba	CYKY3C1,5	1,1	2000				
B10	FA	2	sv. chodba	CYKY3C1,5	1,06	2000				
B16	FA	3	požární venti.	CYKY3C2,5	0,68	2000				
B10	FA	4	sv. kanceláře	CYKY3C1,5	1,08	2000				
B10			rezerva							
B10			sv. kanc	CYKY3C1,5	1,08	2000				
B16			klimatizace	CYKY3C2,5	0,68	2000				
B16			klimatizace č. 2	CYKY3C2,5	0,68	2000				
B16			klimatizace č. 2	CYKY3C2,5	0,68	2000				
B16			klimatizace č. 2	CYKY3C2,5	0,68	2000				
B16			klimatizace č. 1	CYKY3C2,5	0,68	2000				

SEKCE UPS

B10	FA	1	čas. spínač	CYKY3C1,5	0,68	Nelze odpojit				
B10	FA	2	zas. 19	CYKY3C2,5	0,68	Nelze odpojit				
B10	FA	3	zas. 23	CYKY3C2,5	0,68	Nelze odpojit				
B10	FA	4	sta	CYKY3C1,5	0,68	Nelze odpojit				
B10	FA	5	zas. kanc. pc	CYKY3C1,5	0,68	Nelze odpojit				
B16	FA	6	vt9b	CYKY3C2,5	0,68	Nelze odpojit				
B10	FA	7	rm 9b	CYKY3C2,5	0,68	Nelze odpojit				
B6	FA	8	fa8	CYKY3C2,5	0,68	Nelze odpojit				
10/0,03	FA	9	sv. střecha	CYKY3C2,5	0,68	2000	25	15	0	
B10	FA	10	kamera střecha	CYKY3C2,5	0,68	Nelze odpojit				
16/0,03	FA	11	sv. a kam	CYKY3C2,5	0,68	2000	22	20	0, 4	

RS-8b

SÍT

B10	FA	1	os. kanceláře	CYKY3C1,5	0,68	2000				
B10	FA	2	os. kanceláře	CYKY3C1,5	0,68	2000				
B10	FA	3	os. kanceláře	CYKY3C1,5	0,68	2000				
B10	FA	4	os. chodba	CYKY3C1,5	0,68	2000				
B10	FA	5	os. schodiště	CYKY3C1,5	0,68	2000				
B10	FA	6	os. wc	CYKY3C1,5	0,68	2000				
B10	FA	7	os. kanceláře	CYKY3C1,5	0,68	2000				
B10	FA	8	os. kanceláře	CYKY3C1,5	0,68	2000				
B10	FA	9	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,19	2000				
B10	FA	10	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,19	2000				
B10	FA	11	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,19	2000				
B10	FA	12	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,19	2000				
B10	FA	13	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,19	2000				
B10	FA	14	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,19	2000				

10/0,03	FK	0	os. venkovní	CYKY3C1,5	0,68	2000	22	18	0	
B10	FA	15	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,19	2000				
B10	FA	16	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,19	2000				
B10	FA	17	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,19	2000				
B10	FA	18	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,19	2000				
B10	FA	19	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	2000				
B10	FA	20	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,19	2000				
B10	FA	21	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,19	2000				
B10	FA	22	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,19	2000				
B10	FA	23	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,19	2000				
B10	FA	24	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,19	2000				
B10	FA	25	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	2000				
B16	FA	30	za. uklid	CYKY3C2,5	1,06	2000				
B16	FA	31	za. uklid	CYKY3C2,5	1,06	2000				
B16	FA	32	za. lednice	CYKY3C2,5	1,06	2000				
B16	FA	33	za. kávovar	CYKY3C2,5	1,06	2000				
B16	FA	34	za. mikrovlnka	CYKY3C2,5	1,06	2000				
B16	FA	35	za. vafič	CYKY3C2,5	1,06	2000				
B6	FA	36	pisoar	CYKY3C2,5	1,06	2000				
B10	FA	37	fanco	CYKY3C1,5	1,06	2000				
B10	FA	38	fanco	CYKY3C1,5	1,06	2000				
B10	FA	39	za. chodba	CYKY3C2,5	1,06	2000				
B10	FA	40	žaluzie	CYKY3C2,5	1,06	2000				
B6	FA	41	hodiny	CYKY3C1,5	1,06	2000				
B10	FA	50	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	2000				
B10	FA	51	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	2000				
B10	FA	52	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	2000				
B10	FA	53	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	2000				
B10	FA	54	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	2000				
B10	FA	55	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	2000				
B10	FA	56	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	2000				
B10	FA	57	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	2000				
B10	FA	58	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	2000				
B10	FA	59	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	2000				
B10	FA	60	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	2000				
B10	FA	61	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	2000				
B10	FA	62	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	2000				
B10	FA	63	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	2000				
B10	FA	64	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	2000				
B10	FA	65	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	2000				
SEKCE DA										
B10	FA	1	sv. chodba	CYKY3C1,5	1,06	2000				
B10	FA	2	sv. schodiště	CYKY3C1,5	1,1	2000				
B16			ch. tiskárna	CYKY3C2,5	1,08	2000				
SEKCE UPS										
B16	FA	1	vt9b	CYKY3C2,5	0,68	Nelze odpojit				
B10	FA	2	čas. spinač	CYKY3C1,5	0,68	Nelze odpojit				
B10	FA	3	zas. kanc. pc	CYKY3C1,5	0,68	Nelze odpojit				
RS-7b										
SEKCE SÍŤ										
B10	FA	1	os. kanceláře	CYKY3C1,5	1,49	500				
B10	FA	2	os. kanceláře	CYKY3C1,5	1,49	500				
B10	FA	3	os. kanceláře	CYKY3C1,5	1,49	500				
B10	FA	4	os. chodba	CYKY3C1,5	1,49	500				
B10	FA	5	os. schodiště	CYKY3C1,5	1,49	500				
B10	FA	6	os. wc	CYKY3C1,5	0,68	500				
B10	FA	7	rez.	CYKY3C1,5	0,68	500				
B10	FA	8	os. kanceláře	CYKY3C1,5	1,49	500				
B10	FA	9	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,19	500				
B10	FA	10	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,19	500				
B10	FA	11	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,19	500				
B10	FA	12	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,19	500				
B10	FA	13	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,19	500				

B16	FA	14	za. kanceláre	CYKY3C2,5	1,19	500				
10/0,03	FK	0	os. venkovní	CYKY3C1,5	0,68	500	19	15	0,2	
B10	FA	15	za. kanceláre	CYKY3C2,5	1,19	500				
B10	FA	16	za. kanceláre	CYKY3C2,5	1,19	500				
B10	FA	17	za. kanceláre	CYKY3C2,5	1,19	500				
B10	FA	18	za. kanceláre	CYKY3C2,5	1,19	500				
B10	FA	19	za. kanceláre	CYKY3C2,5	1,19	500				
B10	FA	20	za. kanceláre	CYKY3C2,5	1,19	500				
B10	FA	21	za. kanceláre	CYKY3C2,5	1,19	500				
B10	FA	22	za. kanceláre	CYKY3C2,5	1,19	500				
B10	FA	23	za. kanceláre	CYKY3C2,5	1,19	500				
B10	FA	24	za. kanceláre	CYKY3C2,5	1,19	500				
B10	FA	25	za. kanceláre	CYKY3C2,5	1,19	500				
B16	FA	30	za. uklid	CYKY3C2,5	1,06	500				
B16	FA	31	za. uklid	CYKY3C2,5	1,06	500				
B16	FA	32	za. lednice	CYKY3C2,5	1,06	500				
B16	FA	33	za. kávovar	CYKY3C2,5	1,06	500				
B16	FA	34	za. mikrovlňka	CYKY3C2,5	1,06	500				
B16	FA	35	za. vařič	CYKY3C2,5	1,06	500				
B6	FA	36	pisoar	CYKY3C2,5	1,06	500				
B10	FA	37	fanco	CYKY3C1,5	1,06	500				
B10	FA	38	fanco	CYKY3C1,5	1,06	500				
B10	FA	39	za. chodba	CYKY3C2,5	1,06	500				
B10	FA	40	žaluzie	CYKY3C2,5	1,06	500				
B6	FA	41	hodiny	CYKY3C1,5	1,06	500				
B10	FA	50	rezerva	CYKY3C2,5	0,68	500				
B10	FA	51	rezerva	CYKY3C2,5	0,68	500				
B10	FA	52	rezerva	CYKY3C2,5	0,68	500				
B10	FA	53	rezerva	CYKY3C2,5	0,68	500				
B10	FA	54	rezerva	CYKY3C2,5	0,68	500				
B10	FA	55	rezerva	CYKY3C2,5	0,68	500				
B10	FA	56	za. kanceláre	CYKY3C2,5	0,68	500				
B10	FA	57	za. kanceláre	CYKY3C2,5	0,68	500				
B10	FA	58	za. kanceláre	CYKY3C2,5	0,68	500				
B10	FA	59	za. kanceláre	CYKY3C2,5	0,68	500				
B10	FA	60	za. kanceláre	CYKY3C2,5	0,68	500				
B10	FA	61	za. kanceláre	CYKY3C2,5	0,68	500				
B10	FA	62	za. kanceláre	CYKY3C2,5	0,68	500				
B10	FA	63	za. kanceláre	CYKY3C2,5	0,68	500				
B10	FA	64	za. kanceláre	CYKY3C2,5	0,68	500				
B10	FA	65	za. kanceláre	CYKY3C2,5	0,68	500				
B6	FA	66	žaluzie	CYKY3C2,5	1,49	2000				
SEKCE DA										
B10	FA	1	sv. chodba	CYKY3C1,5	1,49	500				
B10	FA	2	sv. schodiště	CYKY3C1,5	1,49	500				
B6	FA	3	m 602 sv. a ventilátor	CYKY3C1,5	0,85	2000				
B10	FA	10	sv. kancel.	CYKY3C1,5	0,95	2000				
B16			ch. tiskárna	CYKY3C2,5	1,15	500				
SEKCE UPS										
B10	FA	1	čas. spínač	CYKY3C1,5	0,68	Nelze odpojit				
B10	FA	2	EPS	CYKY3C1,5	0,68	Nelze odpojit				
B10	FA	3	EZS	CYKY3C1,5	0,68	Nelze odpojit				
B10	FA	3	STA	CYKY3C1,5	0,68	Nelze odpojit				
B10	FA	4	MAR	CYKY3C1,5	0,68	Nelze odpojit				
B16	FA	5	vt7b	CYKY3C2,5	0,90	Nelze odpojit				
B25		6	rozvaděč ri 7b1	CYKY3C1,5	0,68	Nelze odpojit				
RS-5b										
SEKCE SÍŤ										
B10	FA	1	os. kanceláre	CYKY3C1,5	0,68	500				

B10	FA	2	os. kanceláře	CYKY3C1,5	0,68	500				
B10	FA	3	os. kanceláře	CYKY3C1,5	0,68	500				
B10	FA	4	os. chodba	CYKY3C1,5	0,68	500				
B10	FA	5	os. wc	CYKY3C1,5	0,68	500				
B10	FA	6	os. schodiště	CYKY3C1,5	0,68	500				
B10	FA	7	os. hala	CYKY3C1,5	0,68	500				
B10	FA	8	os. schodiště	CYKY3C1,5	0,68	500				
B10	FA	9	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	500				
B10	FA	10	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	500				
B10	FA	11	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	500				
B10	FA	12	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	500				
B10	FA	13	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	500				
B10	FA	14	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	500				
10/0,03	FK	6	os. venkovní	CYKY3C1,5	0,68	500	25	11	0	
B10	FA	15	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	500				
B10	FA	16	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	500				
B10	FA	17	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	500				
B10	FA	18	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	500				
B10	FA	19	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	500				
B10	FA	20	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	500				
B10	FA	21	rezerva	CYKY3C2,5	1,06	500				
B10	FA	22	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	500				
B10	FA	23	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	500				
B10	FA	24	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	500				
B10	FA	25	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	500				
B16	FA	30	za. uklid	CYKY3C2,5	1,06	500				
B16	FA	31	za. chodba	CYKY3C2,5	1,06	500				
B16	FA	32	za. lednice	CYKY3C2,5	1,06	500				
B16	FA	33	za. kávovar	CYKY3C2,5	1,06	500				
B16	FA	34	za. mikrovlnka	CYKY3C2,5	1,06	500				
B16	FA	35	za. vafič	CYKY3C2,5	1,06	500				
B6	FA	36	pisoar	CYKY3C2,5	1,06	500				
B10	FA	37	rezerva							
B10	FA	38	čas	CYKY3C2,5	1,06	500				
B10	FA	39	čguli	CYKY3C2,5	1,06	500				
SEKCE DA										
B10	FA	1	sv. chodba	CYKY3C1,5	1,1	500				
B10	FA	2	sv. chodba	CYKY3C1,5	1,06	500				
B16	FA	3	s.schodiště.	CYKY3C2,5	0,68	500				
SEKCE UPS										
B10	FA	1	čas. spinač	CYKY3C1,5	0,68	Nelze odpojit				
B10	FA	2	EPS	CYKY3C2,5	0,68	Nelze odpojit				
B10	FA	3	EZS	CYKY3C2,5	0,68	Nelze odpojit				
B10	FA	4	STA	CYKY3C1,5	0,68	Nelze odpojit				
B10	FA	5	MaR	CYKY3C1,5	0,68	Nelze odpojit				
B16	FA	6	VT-5b	CYKY3C2,5	0,68	Nelze odpojit				
B16	FA	7	VT-5b	CYKY3C2,5	0,68	Nelze odpojit				
B6	FA	8	REZERVA							
16/1/B	FA	9	REZERVA							
25/1/B	FA	11	RB-3b1	CYKY3C6	0,68	Nelze odpojit				
25/1/B	FA	12	RB-3b2	CYKY3C6	0,68	Nelze odpojit				
25/1/B	FA	13	RB-3b3	CYKY3C6	0,68	Nelze odpojit				
25/1/B	FA	14	RB-3b4	CYKY3C6	0,68	Nelze odpojit				
25/1/B	FA	15	RB-3b5	CYKY3C6	0,68	Nelze odpojit				
25/1/B	FA	16	RB-3b6	CYKY3C6	0,68	Nelze odpojit				
25/1/B	FA	17	RB-3b7	CYKY3C6	0,68	Nelze				

						odpojit				
RS-4b										
SEKCE SÍŤ										
B10	FA	1	os. kanceláře	CYKY3C1,5	0,68	500				
B10	FA	2	os. kanceláře	CYKY3C1,5	0,68	500				
B10	FA	3	os. kanceláře	CYKY3C1,5	0,68	500				
B10	FA	4	os. chodba	CYKY3C1,5	0,68	500				
B10	FA	5	os. wc	CYKY3C1,5	0,68	500				
B10	FA	6	os. schodiště	CYKY3C1,5	0,68	500				
B10	FA	7	os. hala	CYKY3C1,5	0,68	500				
B10	FA	8	os. schodiště	CYKY3C1,5	0,68	500				
B10	FA	9	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	500				
B10	FA	10	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	500				
B10	FA	11	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	500				
B10	FA	12	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	500				
B10	FA	13	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	500				
B10	FA	14	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	500				
10/0,03	FK	6	os. venkovní	CYKY3C1,5	0,68	500	25	11	0	
B10	FA	15	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	500				
B10	FA	16	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	500				
B10	FA	17	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	500				
B10	FA	18	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	500				
B10	FA	19	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	500				
B10	FA	20	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	500				
B10	FA	21	rezerva							
B10	FA	22	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	500				
B10	FA	23	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	500				
B10	FA	24	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	500				
B10	FA	25	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	500				
B16	FA	30	za. uklid	CYKY3C2,5	1,06	500				
B16	FA	31	za. chodba	CYKY3C2,5	1,06	500				
B16	FA	32	za. lednice	CYKY3C2,5	1,06	500				
B16	FA	33	za. kávovar	CYKY3C2,5	1,06	500				
B16	FA	34	za. mikrovlnka	CYKY3C2,5	1,06	500				
B16	FA	35	za. vařič	CYKY3C2,5	1,06	500				
B6	FA	36	pisoár	CYKY3C2,5	1,06	500				
B10	FA	37	rezerva							
B10	FA	38	čas	CYKY3C2,5	1,06	500				
SEKCE DA										
B10	FA	1	sv. chodba	CYKY3C1,5	1,1	500				
B10	FA	2	sv. chodba	CYKY3C1,5	1,06	500				
B16	FA	3	s. schodiště	CYKY3C2,5	0,68	500				
SEKCE UPS										
B10	FA	1	čas. spínač	CYKY3C1,5	0,68	Nelze odpojit				
B10	FA	2	EPS	CYKY3C2,5	0,68	Nelze odpojit				
B10	FA	3	EZS	CYKY3C2,5	0,68	Nelze odpojit				
B10	FA	4	STA	CYKY3C1,5	0,68	Nelze odpojit				
B10	FA	5	MaR	CYKY3C1,5	0,68	Nelze odpojit				
B16	FA	6	VT-5b	CYKY3C2,5	0,68	Nelze odpojit				
B16	FA	7	VT-5b	CYKY3C2,5	0,68	Nelze odpojit				
B6	FA	8	REZERVA							
16/1/B	FA	9	REZERVA							
25/1/B	FA	11	RB-3b1	CYKY3C6	0,68	Nelze odpojit				
25/1/B	FA	12	RB-3b2	CYKY3C6	0,68	Nelze odpojit				
25/1/B	FA	13	RB-3b3	CYKY3C6	0,68	Nelze odpojit				
25/1/B	FA	14	RB-3b4	CYKY3C6	0,68	Nelze odpojit				

25/1/B	FA	15	RB-3b5	CYKY3C6	0,68	Nelze odpojit				
25/1/B	FA	16	RB-3b6	CYKY3C6	0,68	Nelze odpojit				
25/1/B	FA	17	RB-3b7	CYKY3C6	0,68	Nelze odpojit				
RS-4b										
SEKCE SÍŤ										
B10	FA	1	os. kanceláře	CYKY3C1,5	0,68	500				
B10	FA	2	os. kanceláře	CYKY3C1,5	0,68	500				
B10	FA	3	os. kanceláře	CYKY3C1,5	0,68	500				
B10	FA	4	os. chodba	CYKY3C1,5	0,68	500				
B10	FA	5	os. wc	CYKY3C1,5	0,68	500				
B10	FA	6	os. schodiště	CYKY3C1,5	0,68	500				
B10	FA	7	os. hala	CYKY3C1,5	0,68	500				
B10	FA	8	os. schodiště	CYKY3C1,5	0,68	500				
B10	FA	9	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	500				
B10	FA	10	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	500				
B10	FA	11	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	500				
B10	FA	12	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	500				
B10	FA	13	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	500				
B10	FA	14	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	500				
10/0,03	FK	6	os. venkovní	CYKY3C1,5	0,68	500	25	11	0	
B10	FA	15	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	500				
B10	FA	16	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	500				
B10	FA	17	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	500				
B10	FA	18	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	500				
B10	FA	19	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	500				
B10	FA	20	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	500				
B10	FA	21	rezerva							
B10	FA	22	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	500				
B10	FA	23	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	500				
B10	FA	24	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	500				
B10	FA	25	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	500				
B16	FA	30	za. uklid	CYKY3C2,5	1,06	500				
B16	FA	31	za. chodba	CYKY3C2,5	1,06	500				
B16	FA	32	za. lednice	CYKY3C2,5	1,06	500				
B16	FA	33	za. kávovar	CYKY3C2,5	1,06	500				
B16	FA	34	za. mikrovlnka	CYKY3C2,5	1,06	500				
B16	FA	35	za. vařič	CYKY3C2,5	1,06	500				
B6	FA	36	pisár	CYKY3C2,5	1,06	500				
B10	FA	37	rezerva							
B10	FA	38	čas	CYKY3C2,5	1,06	500				
SEKCE DA										
B10	FA	1	sv. chodba	CYKY3C1,5	1,1	500				
B10	FA	2	sv. chodba	CYKY3C1,5	1,06	500				
B16	FA	3	s.schodiště	CYKY3C2,5	0,68	500				
SEKCE UPS										
B10	FA	1	čas. spínač	CYKY3C1,5	0,68	Nelze odpojit				
B10	FA	2	EPS	CYKY3C2,5	0,68	Nelze odpojit				
B10	FA	3	EZS	CYKY3C2,5	0,68	Nelze odpojit				
B10	FA	4	STA	CYKY3C1,5	0,68	Nelze odpojit				
B10	FA	5	MaR	CYKY3C1,5	0,68	Nelze odpojit				
B16	FA	6	VT-5b	CYKY3C2,5	0,68	Nelze odpojit				
B16	FA	7	VT-5b	CYKY3C2,5	0,68	Nelze odpojit				
B6	FA	8	REZERVA							
16/1/B	FA	9	REZERVA							
25/1/B	FA	11	RB-3b1	CYKY3C6	0,68	Nelze odpojit				
25/1/B	FA	12	RB-3b2	CYKY3C6	0,68	Nelze				

						odpojit				
25/1/B	FA	13	RB-3b3	CYKY3C6	0,68	Nelze odpojit				
25/1/B	FA	14	RB-3b4	CYKY3C6	0,68	Nelze odpojit				
25/1/B	FA	15	RB-3b5	CYKY3C6	0,68	Nelze odpojit				
25/1/B	FA	16	RB-3b6	CYKY3C6	0,68	Nelze odpojit				
25/1/B	FA	17	RB-3b7	CYKY3C6	0,68	Nelze odpojit				
RS-2b										
SEKCE SÍŤ										
B10	FA	1	os. kanceláře	CYKY3C1,5	0,68	500				
B10	FA	2	os. kanceláře	CYKY3C1,5	0,68	500				
B10	FA	3	os. kanceláře	CYKY3C1,5	0,68	500				
B10	FA	4	os. chodba	CYKY3C1,5	0,68	500				
10/0,003	FK	5	os. wc	CYKY3C1,5	0,68	500	25	11	0	
B10	FA	6	os. uklid	CYKY3C1,5	0,68	500				
B10	FA	7	os. hala	CYKY3C1,5	0,68	500				
B10	FA	8	os. schodiště	CYKY3C1,5	0,68	500				
B10	FA	9	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	500				
B10	FA	10	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	500				
B10	FA	11	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	500				
B10	FA	12	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	500				
B10	FA	13	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	500				
B10	FA	14	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	500				
B10	FA	15	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	500				
B10	FA	16	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	500				
B10	FA	17	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	500				
B10	FA	18	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	500				
B10	FA	19	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	500				
B10	FA	20	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	500				
B10	FA	21	z. kancelář	CYKY3C2,5	1,06	500				
B10	FA	22	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	500				
B10	FA	23	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	500				
B10	FA	24	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	500				
B10	FA	25	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	500				
B16	FA	30	za. uklid	CYKY3C2,5	1,06	500				
B16	FA	31	za. chodba	CYKY3C2,5	1,06	500				
B16	FA	32	za. lednice	CYKY3C2,5	1,06	500				
B16	FA	33	za. kávovar	CYKY3C2,5	1,06	500				
B16	FA	34	za. mikrovlnka	CYKY3C2,5	1,06	500				
B16	FA	35	za. vaříč	CYKY3C2,5	1,06	500				
B6	FA	36	pisoár	CYKY3C2,5	1,06	500				
B10	FA	37	rezerva							
B10	FA	38	čas	CYKY3C2,5	1,06	500				
SEKCE DA										
B10	FA	1	sv. chodba	CYKY3C1,5	1,1	500				
B10	FA	2	sv. chodba	CYKY3C1,5	1,06	500				
B10	FA	3	s. schodiště	CYKY3C1,5	0,68	500				
10/1/B			s. fonotéka	CYKY3C1,5	0,68	500				
10/1/B			s. archiv	CYKY3C1,5	0,68	500				
SEKCE UPS										
B10	FA	1	čas. spinač	CYKY3C1,5	0,68	Nelze odpojit				
B10	FA	2	EPS	CYKY3C2,5	0,68	Nelze odpojit				
B10	FA	3	EZS	CYKY3C2,5	0,68	Nelze odpojit				
B10	FA	4	STA	CYKY3C1,5	0,68	Nelze odpojit				
B10	FA	5	MaR	CYKY3C1,5	0,68	Nelze odpojit				
B16	FA	6	rezerva							
B16	FA	7	rezerva							
B6	FA	8	REZERVA							

16/1/B	FA	9	REZERVA						
RS-1b									
SEKCE SÍŤ									
B10	FA	1	os. kanceláře	CYKY3C1,5	0,68	500			
B10	FA	2	os. kanceláře	CYKY3C1,5	0,68	500			
B10	FA	3	os. kanceláře	CYKY3C1,5	0,68	500			
B10	FA	4	os. chodba	CYKY3C1,5	0,68	500			
B10	FK	5	s. sklad	CYKY3C1,5	0,68	500			
10/0,003	FA	6	os. wc	CYKY3C1,5	0,68	500	25	11	0
B10	FA	7	os. hala	CYKY3C1,5	0,68	500			
B10	FA	8	os.schodistě	CYKY3C1,5	0,68	500			
B10	FA	9	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	500			
B16	FA	10	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	500			
B16	FA	11	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	500			
B16	FA	12	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	500			
B16	FA	13	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	500			
B16	FA	14	za. kanceláře	CYKY3C2,5	0,68	500			
B16	FA	15	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	500			
B16	FA	16	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	500			
B16	FA	17	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	500			
B10	FA	40	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	500			
B10	FA	41	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	500			
B10	FA	42	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	500			
B10	FA	43	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	500			
B10	FA	44	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	500			
B10	FA	45	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	500			
B10	FA	46	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	500			
B10	FA	47	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	500			
B10	FA	48	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	500			
B16	FA	49	za. kanceláře	CYKY3C2,5	1,06	500			
SEKCE DA									
B10	FA	1	sv. chodba	CYKY3C1,5	1,1	500			
B10	FA	2	sv. chodba	CYKY3C1,5	1,06	500			
B10	FA	3	s.schodiště.	CYKY3C1,5	0,68	500			
16/1/B			sZdrojovna	CYKY3C2,5	0,68	500			
SEKCE UPS									
B10	FA	1	čas. spínač	CYKY3C1,5	0,68	Nelze odpojit			
B10	FA	2	EPS	CYKY3C2,5	0,68	Nelze odpojit			
B10	FA	3	EZS	CYKY3C2,5	0,68	Nelze odpojit			
B10	FA	4	STA	CYKY3C1,5	0,68	Nelze odpojit			
B10	FA	5	MaR	CYKY3C1,5	0,68	Nelze odpojit			
10/1/B	FA	6	vt-1b	CYKY3C1,5	0,68	Nelze odpojit			
10/1/B	FA	7	MaR	CYKY3C1,5	0,68	Nelze odpojit			
10/1/B	FA	8	ustředna	CYKY3C1,5	0,68	Nelze odpojit			
16/1/B	FA	9	REZERVA						
RT-1b1									
20/3/B			USTŘERNA	CYKY 5C6	0,75	Nelze odpojit			
10/1/B			Rezerva						
10/1/B			Sv. 3	CYKY 3C1,5	0,75	2000			
16/1/B			EZS	CYKY 3C2,5	0,75	Nelze odpojit			
20/1/D			MaR	CYKY 3C2,5	0,75	Nelze odpojit			
16/1/B			RWA 3np	CYKY 3C2,5	0,75	2000			
10/1/B			Rezerva						
6/1/B			Rezerva						
16/1/B			Z. 10	CYKY 3C2,5	0,75	2000			
16/1/B			Z. 11	CYKY 3C2,5	0,75	2000			
16/1/B			z.12	CYKY 3C2,5	0,75	2000			

16/1/B		Z.13	CYKY 3C2,5	0,75	2000				
16/1/B		1	R.15	CYKY 3C2,5	0,75	2000			
16/1/B		2	R.15	CYKY 3C2,5	0,75	2000			
16/1/B		3	R.15	CYKY 3C2,5	0,75	2000			
16/1/B		4	R.15	CYKY 3C2,5	0,75	2000			
16/1/B		5	R.15	CYKY 3C2,5	0,75	2000			
16/1/B		6	R.15	CYKY 3C2,5	0,75	2000			
10/1/B		EPS 20	CYKY 3C1,5	0,75	2000				
10/1/B		EZS 20	CYKY 3C1,5	0,75	2000				
10/1/B		SKV	CYKY 3C1,5	0,75	2000				
6/1/B		ACS	CYKY 3C1,5	0,75	2000				
6/1/B		CCTV	CYKY 3C1,5	0,75	2000				
6/1/B		CCTV	CYKY 3C1,5	0,75	2000				
6/1/B		ZAS TV	CYKY 3C1,5	0,75	2000				
6/1/B		PCLMS 31	CYKY 3C1,5	0,75	2000				
6/1/B		PCLMS 32	CYKY 3C1,5	0,75	2000				
6/1/B		PCLMS 33	CYKY 3C1,5	0,75	2000				
6/1/B		Rezerva							
6/1/B		El. zámek	CYKY 3C1,5	0,75	2000				
6/1/B		CCTV	CYKY 3C1,5	0,75	2000				
6/1/B		R1	CYKY 3C1,5	0,75	2000				
6/1/B		R6	CYKY 3C1,5	0,75	2000				
RT1b2									
25/3/0,003						22	9	0	
10/1/B		Zas 2 servisni	CYKY3C2,5	0,82	2000				
10/1/B		Zas. pult 2	CYKY3C2,5	0,95	2000				
20/1/B		T- mobil	CYKY3C2,5	Správa operátora mob. sítě					
RT3b0									
16/1/B		RT-3b1 napájení	CYKY3C2,5	0,68	2000				
16/1/B		RT-3b2 napájení	CYKY3C2,5	0,67	2000				
16/1/B		RT-3b3 napájení	CYKY3C2,5	0,72	2000				
RT3b1									
10/3/B		s. rampa	CYKY 5C1,5	0,68	2000				
10/3/B		s. rampa	CYKY 5C1,5	0,67	2000				
16/1/B	RT	10	CYKY3C2,5	0,72	2000				
16/1/B	RT	11	CYKY3C2,5	0,68	2000				
16/1/B	RT	13	CYKY3C2,5	0,67	2000				
16/1/B	RT	14	CYKY3C2,5	0,72	2000				
16/1/B	RT	12	CYKY3C2,5	0,68	2000				
16/1/B	RT	15	CYKY3C2,5	0,67	2000				
RT3b3									
10/3/B		s. rampa	CYKY 5C1,5	0,68	2000				
10/3/B		s. rampa	CYKY 5C1,5	0,67	2000				
16/1/B	RT	10	CYKY3C2,5	0,72	2000				
16/1/B	RT	11	CYKY3C2,5	0,68	2000				
16/1/B	RT	13	CYKY3C2,5	0,67	2000				
16/1/B	RT	14	CYKY3C2,5	0,72	2000				
16/1/B	RT	12	CYKY3C2,5	0,68	2000				
16/1/B	RT	15	CYKY3C2,5	0,67	2000				
RT3b4									
10/3/B		s. rampa	CYKY 5C1,5	0,67	2000				
16/1/B	RT	10	CYKY3C2,5	0,72	2000				
16/1/B	RT	11	CYKY3C2,5	0,68	2000				
16/1/B	RT	12	CYKY3C2,5	0,68	2000				
RT3b5									
10/3/B		s. rampa	CYKY 5C1,5	0,67	2000				
16/1/B	RT	10	CYKY3C2,5	0,72	2000				
16/1/B	RT	11	CYKY3C2,5	0,68	2000				
16/1/B	RT	12	CYKY3C2,5	0,68	2000				
RT3b6									
10/3/B		s. rampa	CYKY 5C1,5	0,67	2000				
16/1/B	RT	10	CYKY3C2,5	0,72	2000				
16/1/B	RT	11	CYKY3C2,5	0,68	2000				
16/1/B	RT	12	CYKY3C2,5	0,68	2000				

RT3b7									
10/3/B		s. rampa		CYKY 5C1,5	0,67	2000			
16/1/B	RT	10		CYKY3C2,5	0,72	2000			
16/1/B	RT	11		CYKY3C2,5	0,68	2000			
16/1/B	RT	12		CYKY3C2,5	0,68	2000			
RT3b8									
10/3/B		s. rampa		CYKY 5C1,5	0,67	2000			
16/1/B	RT	11		CYKY3C2,5	0,72	2000			
16/1/B	RT	12		CYKY3C2,5	0,68	2000			
16/1/B	RT	13		CYKY3C2,5	0,68	2000			
RT3b9									
10/3/B		s. rampa		CYKY 5C1,5	0,67	2000			
16/1/B	RT	10		CYKY3C2,5	0,72	2000			
16/1/B	RT	11		CYKY3C2,5	0,68	2000			
16/1/B	RT	12		CYKY3C2,5	0,68	2000			
RT3b10									
10/3/B		s. rampa		CYKY 5C1,5	0,68	2000			
10/3/B		s. rampa		CYKY 5C1,5	0,67	2000			
16/1/B	RT	10		CYKY3C2,5	0,72	2000			
16/1/B	RT	11		CYKY3C2,5	0,68	2000			
16/1/B	RT	13		CYKY3C2,5	0,67	2000			
16/1/B	RT	14		CYKY3C2,5	0,72	2000			
16/1/B	RT	12		CYKY3C2,5	0,68	2000			
16/1/B	RT	15		CYKY3C2,5	0,67	2000			
RT4b0									
16/1/B	RT-3b1	napájení		CYKY3C2,5	0,68	2000			
16/1/B	RT-3b2	napájení		CYKY3C2,5	0,67	2000			
16/1/B	RT-3b3	napájení		CYKY3C2,5	0,72	2000			
RT4b1									
10/3/B		s. rampa		CYKY 5C1,5	0,68	2000			
10/3/B		s. rampa		CYKY 5C1,5	0,67	2000			
16/1/B	RT	10		CYKY3C2,5	0,72	2000			
16/1/B	RT	11		CYKY3C2,5	0,68	2000			
16/1/B	RT	13		CYKY3C2,5	0,67	2000			
16/1/B	RT	14		CYKY3C2,5	0,72	2000			
16/1/B	RT	12		CYKY3C2,5	0,68	2000			
16/1/B	RT	15		CYKY3C2,5	0,67	2000			
RT4b3									
10/3/B		s. rampa		CYKY 5C1,5	0,68	2000			
10/3/B		s. rampa		CYKY 5C1,5	0,67	2000			
16/1/B	RT	10		CYKY3C2,5	0,72	2000			
16/1/B	RT	11		CYKY3C2,5	0,68	2000			
16/1/B	RT	13		CYKY3C2,5	0,67	2000			
16/1/B	RT	14		CYKY3C2,5	0,72	2000			
16/1/B	RT	12		CYKY3C2,5	0,68	2000			
16/1/B	RT	15		CYKY3C2,5	0,67	2000			
RT4b4									
10/3/B		s. rampa		CYKY 5C1,5	0,67	2000			
16/1/B	RT	10		CYKY3C2,5	0,72	2000			
16/1/B	RT	11		CYKY3C2,5	0,68	2000			
16/1/B	RT	12		CYKY3C2,5	0,68	2000			
RT4b5									
10/3/B		s. rampa		CYKY 5C1,5	0,67	2000			
16/1/B	RT	10		CYKY3C2,5	0,72	2000			
16/1/B	RT	11		CYKY3C2,5	0,68	2000			
16/1/B	RT	12		CYKY3C2,5	0,68	2000			
RT4b6									
10/3/B		s. rampa		CYKY 5C1,5	0,67	2000			
16/1/B	RT	10		CYKY3C2,5	0,72	2000			
16/1/B	RT	11		CYKY3C2,5	0,68	2000			
16/1/B	RT	12		CYKY3C2,5	0,68	2000			

RT5b7									
10/3/B	s. rampa			CYKY 5C1,5	0,67	2000			
16/1/B	RT	10		CYKY3C2,5	0,72	2000			
16/1/B	RT	11		CYKY3C2,5	0,68	2000			
16/1/B	RT	12		CYKY3C2,5	0,68	2000			
RT4b8									
10/3/B	s. rampa			CYKY 5C1,5	0,67	2000			
16/1/B	RT	11		CYKY3C2,5	0,72	2000			
16/1/B	RT	12		CYKY3C2,5	0,68	2000			
16/1/B	RT	13		CYKY3C2,5	0,68	2000			
RT5b0									
16/1/B	RT-3b1	napájení		CYKY3C2,5	0,68	2000			
16/1/B	RT-3b2	napájení		CYKY3C2,5	0,67	2000			
16/1/B	RT-3b3	napájení		CYKY3C2,5	0,72	2000			
RT5b1									
10/3/B	s. rampa			CYKY 5C1,5	0,68	2000			
10/3/B	s. rampa			CYKY 5C1,5	0,67	2000			
16/1/B	RT	10		CYKY3C2,5	0,72	2000			
16/1/B	RT	11		CYKY3C2,5	0,68	2000			
16/1/B	RT	13		CYKY3C2,5	0,67	2000			
16/1/B	RT	14		CYKY3C2,5	0,72	2000			
16/1/B	RT	12		CYKY3C2,5	0,68	2000			
16/1/B	RT	15		CYKY3C2,5	0,67	2000			
RT5b3									
10/3/B	s. rampa			CYKY 5C1,5	0,68	2000			
10/3/B	s. rampa			CYKY 5C1,5	0,67	2000			
16/1/B	RT	10		CYKY3C2,5	0,72	2000			
16/1/B	RT	11		CYKY3C2,5	0,68	2000			
16/1/B	RT	13		CYKY3C2,5	0,67	2000			
16/1/B	RT	14		CYKY3C2,5	0,72	2000			
16/1/B	RT	12		CYKY3C2,5	0,68	2000			
16/1/B	RT	15		CYKY3C2,5	0,67	2000			
RT5b4									
10/3/B	s. rampa			CYKY 5C1,5	0,67	2000			
16/1/B	RT	10		CYKY3C2,5	0,72	2000			
16/1/B	RT	11		CYKY3C2,5	0,68	2000			
16/1/B	RT	12		CYKY3C2,5	0,68	2000			
RT5b5									
10/3/B	s. rampa			CYKY 5C1,5	0,67	2000			
16/1/B	RT	10		CYKY3C2,5	0,72	2000			
16/1/B	RT	11		CYKY3C2,5	0,68	2000			
16/1/B	RT	12		CYKY3C2,5	0,68	2000			
RT5b6									
10/3/B	s. rampa			CYKY 5C1,5	0,67	2000			
16/1/B	RT	10		CYKY3C2,5	0,72	2000			
16/1/B	RT	11		CYKY3C2,5	0,68	2000			
16/1/B	RT	12		CYKY3C2,5	0,68	2000			
RT5b7									
10/3/B	s. rampa			CYKY 5C1,5	0,67	2000			
16/1/B	RT	10		CYKY3C2,5	0,72	2000			
16/1/B	RT	11		CYKY3C2,5	0,68	2000			
16/1/B	RT	12		CYKY3C2,5	0,68	2000			
RT5b8									
10/3/B	s. rampa			CYKY 5C1,5	0,67	2000			
16/1/B	RT	11		CYKY3C2,5	0,72	2000			
16/1/B	RT	12		CYKY3C2,5	0,68	2000			
16/1/B	RT	13		CYKY3C2,5	0,68	2000			
RT5b9									
10/3/B	s. rampa			CYKY 5C1,5	0,67	2000			
16/1/B	RT	10		CYKY3C2,5	0,72	2000			
16/1/B	RT	11		CYKY3C2,5	0,68	2000			
16/1/B	RT	12		CYKY3C2,5	0,68	2000			

RT5b10									
10/3/B		s. rampa	CYKY 5C1,5	0,68	2000				
10/3/B		s. rampa	CYKY 5C1,5	0,67	2000				
16/1/B	RT	10	CYKY3C2,5	0,72	2000				
16/1/B	RT	11	CYKY3C2,5	0,68	2000				
16/1/B	RT	13	CYKY3C2,5	0,67	2000				
16/1/B	RT	14	CYKY3C2,5	0,72	2000				
16/1/B	RT	12	CYKY3C2,5	0,68	2000				
16/1/B	RT	15	CYKY3C2,5	0,67	2000				
RI-4b1									
16/1/B	z.	PC	CYKY3C2,5	0,72	2000				
16/1/B	z.	PC	CYKY3C2,5	0,68	2000				
16/1/B	z.	PC	CYKY3C2,5	0,67	2000				
16/1/B	RT	10	CYKY3C2,5	0,72	2000				
16/1/B	RT	11	CYKY3C2,5	0,68	2000				
16/1/B	RT	13	CYKY3C2,5	0,67	2000				
16/1/B	RT	14	CYKY3C2,5	0,72	2000				
16/1/B	RT	12	CYKY3C2,5	0,68	2000				
16/1/B	RT	15	CYKY3C2,5	0,67	2000				
RI-4b2									
16/1/B	z.	PC	CYKY3C2,5	0,72	2000				
16/1/B	z.	PC	CYKY3C2,5	0,68	2000				
16/1/B	z.	PC	CYKY3C2,5	0,67	2000				
16/1/B	RT	10	CYKY3C2,5	0,72	2000				
16/1/B	RT	11	CYKY3C2,5	0,68	2000				
16/1/B	RT	13	CYKY3C2,5	0,67	2000				
16/1/B	RT	14	CYKY3C2,5	0,72	2000				
16/1/B	RT	12	CYKY3C2,5	0,68	2000				
16/1/B	RT	15	CYKY3C2,5	0,67	2000				
RI-4b3									
16/1/B	z.	PC	CYKY3C2,5	0,72	2000				
16/1/B	z.	PC	CYKY3C2,5	0,68	2000				
16/1/B	z.	PC	CYKY3C2,5	0,67	2000				
16/1/B	RT	10	CYKY3C2,5	0,72	2000				
16/1/B	RT	11	CYKY3C2,5	0,68	2000				
16/1/B	RT	12	CYKY3C2,5	0,67	2000				
16/1/B		Rezerva	CYKY3C2,5						
16/1/B		Rezerva	CYKY3C2,5						
16/1/B		Rezerva	CYKY3C2,5						
RI-4b4									
16/1/B	z.	PC	CYKY3C2,5	0,72	2000				
16/1/B	z.	PC	CYKY3C2,5	0,68	2000				
16/1/B	z.	PC	CYKY3C2,5	0,67	2000				
16/1/B	RT	10	CYKY3C2,5	0,72	2000				
16/1/B	RT	11	CYKY3C2,5	0,68	2000				
16/1/B	RT	12	CYKY3C2,5	0,67	2000				
16/1/B		Rezerva	CYKY3C2,5						
16/1/B		Rezerva	CYKY3C2,5						
16/1/B		Rezerva	CYKY3C2,5						
RI-4b5									
16/1/B	z.	PC	CYKY3C2,5	0,72	2000				
16/1/B	z.	PC	CYKY3C2,5	0,68	2000				
16/1/B	z.	PC	CYKY3C2,5	0,67	2000				
16/1/B	RT	10	CYKY3C2,5	0,72	2000				
16/1/B	RT	11	CYKY3C2,5	0,68	2000				
16/1/B	RT	12	CYKY3C2,5	0,67	2000				
16/1/B		Rezerva	CYKY3C2,5						
16/1/B		Rezerva	CYKY3C2,5						
16/1/B		Rezerva	CYKY3C2,5						
RI-4b6									
16/1/B	z.	PC	CYKY3C2,5	0,72	2000				
16/1/B	z.	PC	CYKY3C2,5	0,68	2000				
16/1/B	z.	PC	CYKY3C2,5	0,67	2000				
16/1/B	RT	10	CYKY3C2,5	0,72	2000				
16/1/B	RT	11	CYKY3C2,5	0,68	2000				
16/1/B	RT	12	CYKY3C2,5	0,67	2000				
16/1/B		Rezerva	CYKY3C2,5						

16/1/B		Rezerva	CYKY3C2,5						
16/1/B		Rezerva	CYKY3C2,5						
RI-4b7									
16/1/B	z.	PC	CYKY3C2,5	0,72	2000				
16/1/B	z.	PC	CYKY3C2,5	0,68	2000				
16/1/B	z.	PC	CYKY3C2,5	0,67	2000				
16/1/B	RT	10	CYKY3C2,5	0,72	2000				
16/1/B	RT	11	CYKY3C2,5	0,68	2000				
16/1/B	RT	12	CYKY3C2,5	0,67	2000				
16/1/B		Rezerva	CYKY3C2,5						
16/1/B		Rezerva	CYKY3C2,5						
16/1/B		Rezerva	CYKY3C2,5						
RI-4b8									
16/1/B	z.	PC	CYKY3C2,5	0,72	2000				
16/1/B	z.	PC	CYKY3C2,5	0,68	2000				
16/1/B	z.	PC	CYKY3C2,5	0,67	2000				
16/1/B	RT	10	CYKY3C2,5	0,72	2000				
16/1/B	RT	11	CYKY3C2,5	0,68	2000				
16/1/B	RT	12	CYKY3C2,5	0,67	2000				
16/1/B		Rezerva	CYKY3C2,5						
16/1/B		Rezerva	CYKY3C2,5						
16/1/B		Rezerva	CYKY3C2,5						
RI-4b1									
16/1/B	z.	PC	CYKY3C2,5	0,72	2000				
16/1/B	z.	PC	CYKY3C2,5	0,68	2000				
16/1/B	z.	PC	CYKY3C2,5	0,67	2000				
16/1/B	RT	10	CYKY3C2,5	0,72	2000				
16/1/B	RT	11	CYKY3C2,5	0,68	2000				
16/1/B	RT	13	CYKY3C2,5	0,67	2000				
16/1/B	RT	14	CYKY3C2,5	0,72	2000				
16/1/B	RT	12	CYKY3C2,5	0,68	2000				
16/1/B	RT	15	CYKY3C2,5	0,67	2000				
RI-4b2									
16/1/B	z.	PC	CYKY3C2,5	0,72	2000				
16/1/B	z.	PC	CYKY3C2,5	0,68	2000				
16/1/B	z.	PC	CYKY3C2,5	0,67	2000				
16/1/B	RT	10	CYKY3C2,5	0,72	2000				
16/1/B	RT	11	CYKY3C2,5	0,68	2000				
16/1/B	RT	13	CYKY3C2,5	0,67	2000				
16/1/B	RT	14	CYKY3C2,5	0,72	2000				
16/1/B	RT	12	CYKY3C2,5	0,68	2000				
16/1/B	RT	15	CYKY3C2,5	0,67	2000				
RI-3b3									
16/1/B	z.	PC	CYKY3C2,5	0,72	2000				
16/1/B	z.	PC	CYKY3C2,5	0,68	2000				
16/1/B	z.	PC	CYKY3C2,5	0,67	2000				
16/1/B	RT	10	CYKY3C2,5	0,72	2000				
16/1/B	RT	11	CYKY3C2,5	0,68	2000				
16/1/B	RT	12	CYKY3C2,5	0,67	2000				
16/1/B		Rezerva	CYKY3C2,5						
16/1/B		Rezerva	CYKY3C2,5						
16/1/B		Rezerva	CYKY3C2,5						
RI-3b4									
16/1/B	z.	PC	CYKY3C2,5	0,72	2000				
16/1/B	z.	PC	CYKY3C2,5	0,68	2000				
16/1/B	z.	PC	CYKY3C2,5	0,67	2000				
16/1/B	RT	10	CYKY3C2,5	0,72	2000				
16/1/B	RT	11	CYKY3C2,5	0,68	2000				
16/1/B	RT	12	CYKY3C2,5	0,67	2000				
16/1/B		Rezerva	CYKY3C2,5						
16/1/B		Rezerva	CYKY3C2,5						
16/1/B		Rezerva	CYKY3C2,5						
RI-3b5									
16/1/B	z.	PC	CYKY3C2,5	0,72	2000				
16/1/B	z.	PC	CYKY3C2,5	0,68	2000				
16/1/B	z.	PC	CYKY3C2,5	0,67	2000				
16/1/B	RT	10	CYKY3C2,5	0,72	2000				

16/1/B	RT	11	CYKY3C2,5	0,68	2000				
16/1/B	RT	12	CYKY3C2,5	0,67	2000				
16/1/B		Rezerva	CYKY3C2,5						
16/1/B		Rezerva	CYKY3C2,5						
16/1/B		Rezerva	CYKY3C2,5						

Zhodnocení

- Naměřené hodnoty izolačních odporů jsou ve všech případech vyšší než 1 MΩ takže vyhovují ČSN 33 2000-6 čl. 61.3.3.
- Naměřená hodnota přechodového odporu pospojování vodiče nepřesáhla 0,1 Ω a svým průřezem splňuje požadavek ČSN 33 2000-5-54 ed.2 544.2.
- Naměřené hodnoty impedance smyčky uváděné v revizní zprávě jsou v souladu s dimenzováním předřazených jistících prvků a zajišťují požadovanou ochranu automatickým odpojením od zdroje v předepsané době i při uvažovaných bezpečnostních součinitelích (1,5x) podle ČSN 33 20020-4-41 ed.2 čl. 411.4.4.

Během revize nebyly zjištěny žádné závady, které by ohrozily bezpečnost provozovaného zařízení.

Celkový posudek

**ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ JE Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI
V ROZSAHU REVIZE SCHOPNO BEZPEČNÉHO PROVOZU**

Příští doporučená revize v roce 2017

Nedílnou součástí revizní správy jsou přílohy č. 1 – seznam závad a CD

Podpisem této revizní zprávy bere provozovatel prokazatelně na vědomí zjištěné skutečnosti v revizi uvedené.

Revizní zpráva převzata dne



Podpis objednavatele
(razítko)

jméno podpis RTEZ
(razítko)

Rozdělovník: Výtisk číslo 1,2-Provozovatel zařízení
Výtisk číslo 3- Revizní technik

Seznam závad a doporučení Římská 13

Elektroinstalace:

Závady neohrožující bezprostředně majetek a život. Odstranit do 3 měsíců.		
Č.	Umístění	Popis
1	B719	- 2x nefunkční zásuvky + rozvod
2	RS-6a	- P4 1/6 požární ventilace (mechanicky poškozen)
3	RS-4a	- Z. 400V pro filmaře upevnit řádně a zabezpečit proti vytržení a v rozvaděči zakončení slaněných vodičů provést dutinkami.
4	RS-1b	- V místnosti provést pospojování žlabů EZS, EPS, PTV a EI rozvodů
5	RT-4b0	- Provést upevnění vodičů k rozvaděči
6	RT-1b1	- Rozvaděč souží jako věšák obsluhy a před rozvaděčem je nedostatečné místo
7	m.č. A 0310	- V místnosti jsou neživé vodiče trčící ze stěny. (zaizolovat a upevnit do krabičky)
8.	Střecha	- Klimatizace poškozené průchodky a záslepky
9.	RS-02b	- Poškozená zásuvka - Poškození kryt motoru vjezdových vrat od VZP - Nepřípevněné ovládání vrat

Závada velice závažného charakteru !!!


Odstranit v co nejbližším termínu

- **Požární prostupy u rozvaděčů jsou ve velké míře v celé budově poškozeny . Doporučuji okamžitou nápravu stavu.**
- **Všechny rozvaděče klimatizací (RM) vykazují vysoké teploty spínacích prvků (stykače) . Teploty naměřené při revizi stykačů jsou od 110 °C do 165 °C . Okamžitě spínací prvky vyměnit a provést taková opatření, aby se zamezilo nadměrnému oteplování. Provést měření termokamerou a dané prvky vyměnit.**
- **RS-6a - P4 1/6 požární ventilace (mechanicky poškozen)**


Doporučení:

- Věnovat zvýšenou péči osvětlovacím tělesům.
- Provádět preventivní měření rozvaděčů a světelných zdrojů termokamerou.
- Provádět doplňování a opravy do projektové dokumentace dle aktuálního stav

Č. 1

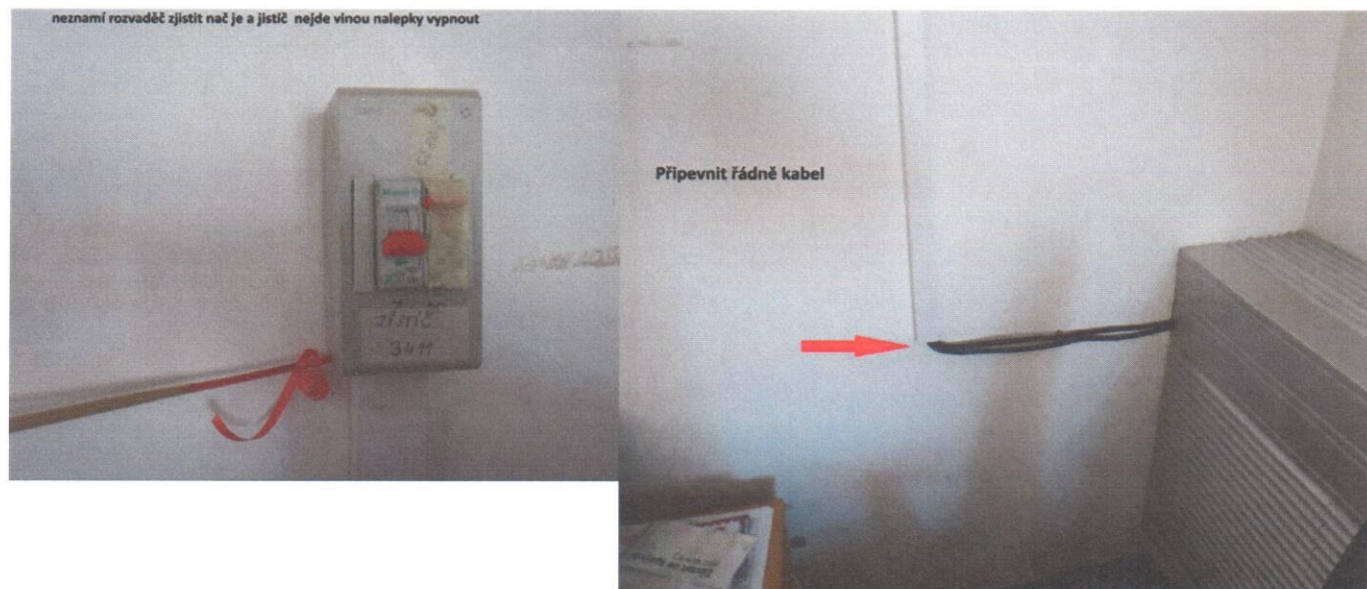

Č.2

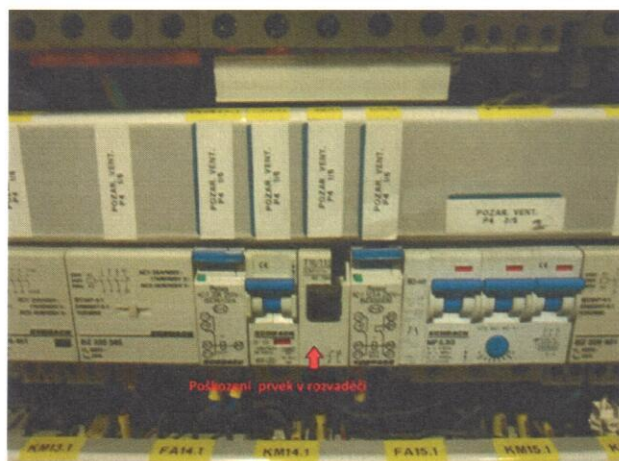

Č.4



Hromosvod



Provést do po spojení klimatizací
